

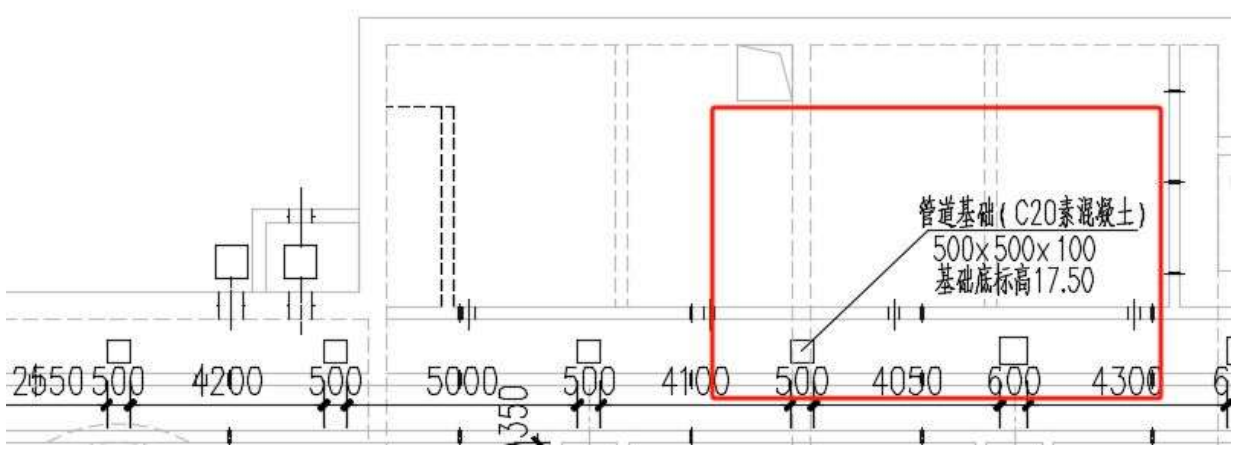
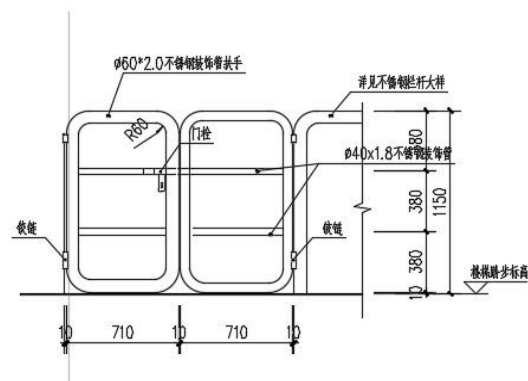

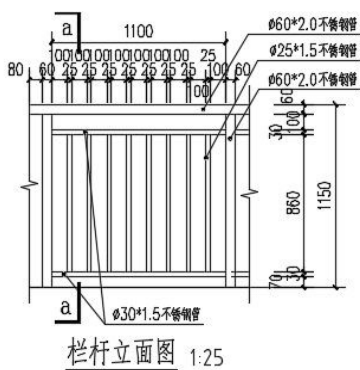


设计业务联系单-02			
项目编号	25P-8304S	项目名称	东莞市大朗蔡边水质净化厂工程
专业	工艺、建筑、结构	编号	LXD-04
图纸名称：AOA生物池			
原因和说明： 根据清单编制过程中提出的意见，自查图纸，并对需明确的内容进行回复，需调整图纸的进行调整。			
业务联系内容：			
1、工艺			
修改工艺图纸25P-8304S-04S，修改内容：			
(1) 04S-11：修改基础尺寸标注，由600×600×100修改为500×500×100			
			
(2) 04S-21、04S-22：明确加药管道序号U分项及序号V分项中阀门材质：材质为PVC			
(3) 04S-21：主要设备表序号Q的盘式曝气器，因脱气区修改为穿孔管曝气，盘式曝气器由2700套修改为2400套。			
2、结构			
修改结构图纸25P-8304S-04G，修改内容：			
1、04G-02:池内转角处二次填充C25混凝土，高度为1米。			
2、04G-21:楼梯LT1宽度为1450，楼梯梁及板宽度均修改为1450mm。			
3、04G-23:删除花纹钢盖板详图及尺寸表，花纹钢盖板同结构设计总说明一致。			
3、建筑			
修改建筑图纸25P-8304S-04J，修改内容：			
(1) 04J-08节点大样图：修改池顶护栏大样图，不锈钢栏杆为1.15米高。			

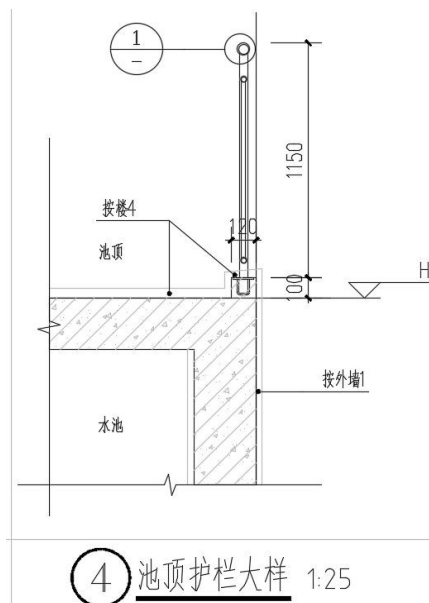

(2) 04J-09门窗表、门窗大样图（一）：补充C1515玻璃窗的纱窗

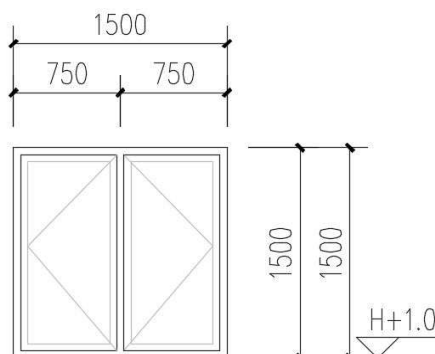

编号	C1515
洞口尺寸	1500X1500
备注	110系列中灰色铝合金+6透明+12空气+6透明) 普通中空安全玻璃窗 (带不锈钢纱窗)

(3) 04J-01-1剖面图、2-2剖面图、3-3剖面图：1-1剖面图修改鼓风机房屋面标注，绝对标高改为26.10

单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司

设计负责人：梁伟 日期：2025.4.28

附件图纸编号	内容	张数	备注

建设单位意见

日期
